

Apraksts:	Uzaicinājums piedalīties SIA "Rīgas ūdens" tirgus izpētē "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves Rīgā, Pureņu ielā 16, būvuzraudzība" (identifikācijas Nr. T.I.121)
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:	2021.gada 29.oktobra plkst.12:00
Kontaktpersona:	SIA "Rīgas ūdens" Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr. 67 088 437, e-pasta adrese: ieva.aprane@rigasudens.lv

Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz **2021.gada 29.oktobra plkst.12:00** nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

SIA "INSPIRITUS" izstrādātā būvprojekta "ŪKT ārējo tīklu izbūve piebraucamā ceļā Pureņu ielā 16, Rīgā" (turpmāk – Būvprojekts) īstenošanas būvdarbu būvuzraudzība saskaņā ar **Pielikumā Nr.1** pievienoto līguma projektu, t.sk., darba uzdevumu, un Būvprojektu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Būvdarbu izpildes laiks ir **45 (četrdesmit piecas)** kalendāra dienas no atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes saņemšanas dienas, Darbu pieņemšanas un nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam termiņš ir **90 (deviņdesmit) kalendāra dienas**, skaitot no Akta par Būvdarbu pabeigšanu abpusējas parakstīšanas dienas.

Būvdarbu apjomi norādīti **Pielikumā Nr.5**.

ATLASES PRASĪBAS:

1. Pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
2. Pretendents līguma izpildei var nodrošināt būvuzraugu, kurš atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" veiks būvuzraudzību objektā un kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzībā.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

1. Pretendenta parakstīts piedāvājums saskaņā ar **Pielikumā Nr.2** pievienoto veidni.
2. Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
3. Pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar **Pielikumā Nr.3** pievienoto veidni.
4. Būvuzrauga pieejamības apliecinājums saskaņā ar **Pielikumā Nr.4** pievienoto veidni.
5. Būvuzrauga spēkā esošas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma polises kopija vai apliecinājums, ka profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums tiks noslēgts 2 (divu) darba dienu laikā pēc būvuzraudzības līguma noslēgšanas.

DOKUMENTU SAŅEMŠANA:

Pirms piedāvājuma iesniegšanas Piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir iespējams iepazīties ar Būvprojektu elektroniskā formātā, pirms tam nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi ieva.aprane@rigasudens.lv un pieprasījumam pievienojot konfidencialitātes apliecinājumu saskaņā ar **Pielikumu Nr.6** (ar Būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) un pilnvaru, ja pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis.

VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

1. Tirgus izpētes rezultātā SIA "Rīgas ūdens" atbilstoši **Pielikumā Nr.1** pievienotajam līguma projektam noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.
2. Pretendents var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā pretendents var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus.

PIELIKUMĀ:

1. Līguma projekts, t.sk. darba uzdevums uz 9 lapām.
2. Piedāvājuma veidne uz 1 lapas.
3. Finanšu piedāvājuma veidne uz 1 lapas.
4. Būvuzrauga pieejamības apliecinājuma veidne uz 1 lapas.
5. Būvdarbu apjomi uz 3 lapām.
6. Konfidencialitātes apliecinājums uz 1 lapas.

Līgums Nr. _____
par ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves Rīgā, Pureņu ielā 16, būvuzraudzību
(Tirgus izpēte Nr.121)

Rīgā, 2021. gada ____.

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās _____ personā, kura darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 2021.gada _____ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2021/____) pamata, turpmāk - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un _____, reģ. Nr. _____, tās _____ personā, kur _____ darbojas uz _____ pamata, turpmāk - **Uzņēmējs**, no otras puses, turpmāk saukti **Līdzēji**, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - **Līgums**:

1. Līguma priekšmets un termiņi

- 1.1. Uzņēmējs veic **Pielikumā Nr.1** norādītā būvobjekta – ūdensvada un kanalizācijas tīklu Rīgā, Pureņu ielā 16 (turpmāk - **Būvobjekts**) izbūves darbu (turpmāk – **Būvdarbi**) būvuzraudzību un Pasūtītāja interešu nodrošināšanu Būvdarbu izpildē (kopā – **Uzdevums**).
- 1.2. Uzdevums tiek veikts Līgumā un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja noslēgto līgumu par Būvdarbu izpildi.
- 1.3. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā samaksāt par Līgumā un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikto Uzdevumu.
- 1.4. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Būvobjektu ir apsekojis, iepazīties ar Uzdevuma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, Būvdarbu izpildes līguma noteikumiem un apzinās Uzdevuma apjomu.

2. Uzdevuma izpildes kārtība

- 2.1. Uzņēmējs uzsāk pildīt Uzdevumu nākamajā dienā pēc Līguma spēkā stāšanās.
- 2.2. Uzņēmējs atbild par fizisko personu (**Pārstāvju**), kuri būs tiešie Uzdevumā norādīto pienākumu izpildītāji, kvalifikācijas atbilstību Uzdevumam. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Pārstāvju darbu un viņu radītajiem zaudējumiem Pasūtītājam vai trešajām personām. Ja Uzņēmējs Pasūtītājam Pārstāvju profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopijas nav iesniedzis līdz Līguma spēkā stāšanās dienai, Uzņēmējs šo polisi kopijas Pasūtītājam iesniedz 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās.
- 2.3. Uzņēmēja Pārstāvis Līguma izpildes ietvaros ir _____ (vārds, uzvārds, darbības sfēra, sertifikāta Nr. _____).
- 2.4. Pasūtītājs jebkurā laikā var prasīt Uzņēmējam Pārstāvja(-u) nomaiņu. Uzņēmējs veic Pārstāvja nomaiņu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc atbilstoša Pasūtītāja rakstveida paziņojuma saņemšanas un rakstveidā paziņo Pasūtītājam par iecelto Pārstāvi.
- 2.5. Pildot Uzdevumu, Uzņēmējs un Pārstāvji neparaksta dokumentus Pasūtītāja vārdā, izņemot gadījumus, kad saņemts atbilstošs Pasūtītāja rakstveida pilnvarojums.
- 2.6. Pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt no Būvdarbu veicēja visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Uzdevuma izpildei.
- 2.7. Pārstāvis jebkurā laikā var sniegt Būvdarbu veicējam saistošus norādījumus Būvdarbu izpildei, Būvdarbu defektu un Būvdarbu izpildedokumentācijas trūkumu novēršanai.
- 2.8. Pārstāvim ir pienākums, tajā skaitā, parakstīt Aktus par izpildītajiem Darbiem un Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, segto darbu pieņemšanas aktus, aktus par fakta konstatāciju.

3. Līdzēju tiesības un pienākumi

- 3.1. Pasūtītājs Līguma izpildei:

- 3.1.1. veic Līgumā paredzētos maksājumus Uzņēmējam;
- 3.1.2. izsniedz Uzņēmējam Pasūtītāja rīcībā esošo un Uzdevuma izpildei nepieciešamo dokumentāciju un informāciju;
- 3.1.3. nepieciešamības gadījumā izsniedz Uzņēmējam pilnvaras Uzdevuma izpildei;
- 3.1.4. jebkurā laikā var pieprasīt no Uzņēmēja informāciju, atzinumus un konsultācijas, kas saistītas ar Būvdarbu izpildi vai Uzdevumu;
- 3.1.5. tiesīgs apturēt Līgumam neatbilstošas Uzņēmēja darbības Uzdevuma izpildē.
- 3.2. Uzņēmējs Līguma izpildei:
 - 3.2.1. veic Līguma **Pielikumā Nr.1** minētos uzdevumus;
 - 3.2.2. informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Būvdarbu izpildes termiņus, izmaksas vai kvalitāti;
 - 3.2.3. pieprasa no Būvdarbu izpildītājiem visu informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešamas Būvdarbu izpildes kontrolei un Uzdevuma izpildei;
 - 3.2.4. saņem no Pasūtītāja Uzdevuma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, pilnvaras un informāciju;
 - 3.2.5. nodrošina Pārstāvju būvobjektā pavadītā laika uzskaiti;
 - 3.2.6. dod Būvdarbu izpildītājiem saistošus uzdevumus;
 - 3.2.7. nodrošina citu Vispārīgajos būvnoteikumos paredzēto būvuzrauga pienākumu izpildi;
 - 3.2.8. pirms Pasūtītāja veiktās Būvdarbu galīgās pārbaudes Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam pārskatu par saskaņā ar Līgumu veikto būvuzrauga pienākumu, tajā skaitā par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu, izpildi, un apliecinājumu, ka inženierbūve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem. Pārskatam Uzņēmējs pievieno Būvdarbu izpildes fotogrāfijas.

4. Līguma cena un norēķinu kārtība

- 4.1. Par Uzdevuma izpildi Uzņēmējs saņem atbilstoši Pārstāvja laika ieguldījumam Uzdevuma izpildē, bet ne vairāk kā **EUR _____ (_____ euro un __ centi)** bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā. PVN tiek piemērots Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
- 4.2. Maksājumu veikšanai tiek piemērotas šādas Pārstāvja stundas likmes un cilvēkstundu ieguldījums Uzdevuma izpildē:

Nr. p.k.	Pārstāvis	Cilvēkstundu ieguldījums	Stundas likme, EUR, bez PVN
1.	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraugs	60	
	Kopā:		

- 4.3. Līguma 4.1.punktā norādīto summu Uzņēmējs saņem, ja Pārstāvis Uzdevuma izpildes laikā Būvobjektā ir pavadījis maksimālo 4.2.punktā norādīto cilvēkstundu skaitu, veicis visus Līgumā norādītos pienākumus un Uzdevums ir izpildīts pilnībā. Par pilnībā izpildītu Uzdevums tiek uzskatīts pēc tam, kad Pasūtītājs pieņem Būvdarbus.
- 4.4. Pasūtītājs samaksu veic sekojošā kārtībā:
 - 4.4.1. starpmaksājumi par iepriekšējā periodā izpildīto Uzdevuma daļu tiek veikti ne biežāk kā reizi mēnesī. No katra starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur Uzdevuma izpildes nodrošinājuma summu 10% (desmit procentu) apmērā;
 - 4.4.2. galīgais norēķins par Uzdevuma izpildi tiek veikts, kad Pasūtītājs no Būvdarbu veicēja ar darbu nodošanas un pieņemšanas aktu Būvdarbus ir pieņēmis.
- 4.5. Līguma 4.4.1.punktā minēto maksājumu saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Uzdevuma daļas izpildes pieņemšanas nodošanas aktu saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto formu.

- 4.6. Galīgā norēķina saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Uzdevuma izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu, kurā norādīta ieturētā Uzdevuma izpildes nodrošinājuma summa.
- 4.7. Pasūtītājs izskata Uzņēmēja iesniegtos maksājuma pieprasījumus 5 (piecu) darba dienu laikā. Konstatējot trūkumus Uzņēmēja iesniegtajos dokumentos, Pasūtītājs par to informē Uzņēmēju un atgriež iesniegtos dokumentus trūkumu novēršanai. Pasūtītājs veic Uzņēmēja rēķina apmaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no tā saņemšanas un akta par Uzdevuma daļas izpildi attiecīgajā periodā vai Uzdevuma izpildes pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas dienas.
- 4.8. Pasūtītājam ir tiesības pārmaksas gadījumā ieturēt Uzņēmējam pārmaksāto summu no nākamā rēķina summas.

5. Uzņēmēja atbildība

- 5.1. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Uzdevuma izpildes laikā Būvdarbu veicējam doto saistošo rīkojumu un norādījumu, saskaņoto un akceptēto dokumentu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm, kā arī par visiem Uzdevuma izpildes laikā patstāvīgi pieņemtajiem lēmumiem.
- 5.2. Uzņēmējs atbild par zaudējumiem vai kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Uzdevuma izpildes laikā nodarīts Pasūtītājam vai trešajai personai.

6. Nepārvarama vara

- 6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas – tādu ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība, tiesu spriedumi un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Līdzēju saprātīgai kontrolei.

7. Uzdevuma izpildes termiņš un Līguma darbība

- 7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. Līgums paliek spēkā līdz Līdzēju savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
- 7.2. Līgums par Būvdarbu izpildi noslēgts _____. Būvdarbu izpildītāja kontaktpersona _____ Būvdarbu līguma izpildes jautājumos ir: _____. Šajā līgumā norādītais Būvdarbu izpildes termiņš ir 45 (četrdesmit piecas) kalendāra dienas, skaitot no Būvdarbu līguma spēkā stāšanās dienas. Būvdarbu izpildi apliecina parakstīts Akts par būvdarbu pabeigšanu Būvobjektā. Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no Akta par būvdarbu pabeigšanu abpusējas parakstīšanas dienas.
- 7.3. Uzņēmējs veic Uzdevuma izpildi līdz Būvdarbu izpildes pabeigšanai un Būvdarbu pieņemšanai no Pasūtītāja puses ar Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu. Gadījumā, ja Būvdarbi tiek pabeigti ilgākā termiņā nekā norādīts Līguma 7.2.punktā, attiecīgi pagarinās Uzdevuma izpildes termiņš.
- 7.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs un Būvdarbu veicējs noslēdz vienošanos par papildu Būvdarbu izpildi vai būtiski tiek pārsniegts plānotais Būvdarbu izpildes laiks un šajā laikā Uzņēmējam rodas ar Uzdevuma izpildi saistīti pamatoti izdevumi, Līdzēji noslēdz Līguma vienošanos par Uzdevuma papildināšanu ar uzdevumu par papildu Būvdarbu būvuzraudzību. Uzņēmējam nav tiesību atteikties veikt papildu Būvdarbu būvuzraudzību.
- 7.5. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja tiesā ir iesniegts pieteikums par otra Līdzēja atzīšanu par maksātnespējīgu.
- 7.6. Pasūtītājam ir tiesības katrā laikā vienpusēji atkāpties no Līguma. Par atkāpšanos no Līguma Pasūtītājs paziņo rakstiski 10 (desmit) darba dienas iepriekš.
- 7.7. Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms termiņa vai apturēt tā darbību savstarpēji rakstiski

vienojoties.

- 7.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

8. Noslēguma noteikumi

- 8.1. Visi strīdi un domstarpības, kas Līdzējiem rodas uz Līguma pamata vai izriet no tā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izskatīts Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 8.2. Informācija, ko satur šis Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otra Līdzēja rakstveida piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi, kā arī uz gadījumiem, ja Līgumā iekļauto informāciju nepieciešams nodot būvdarbu veicējam, uzraugiem un citām ar būvdarbu izpildi un organizāciju saistītām trešajām personām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otram Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.
- 8.3. Pasūtītāja pilnvarotā persona Līguma izpildē, kura tajā skaitā pilnvarota pieņemt izpildīto Uzdevumu, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktus, ir _____.
- 8.4. Pasūtītāja kontaktpersona un Līguma izpildē ir _____.
- 8.5. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē ir _____.
- 8.6. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.
- 8.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Līdzēju vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījuši abi Līdzēji. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
- 8.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, uz 4 (četrām) lapām ar Pielikumu Nr.1 (Darba uzdevums) uz _ (_____) lapas un Pielikumu Nr.2 (Uzdevuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akta paraugs). Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs Uzņēmējam.

9. Līdzēju paraksti un rekvizīti:

Tehniskā specifikācija – darba uzdevums

- I. Būvobjekts:** Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, Rīgā, Pureņu ielā 16.
- II. Dokumentācija:** Darbus jāveic saskaņā ar SIA “INSPIRITUS” izstrādāto būvprojektu “ŪKT ārējo tīklu izbūve piebraucamā ceļā Pureņu ielā 16, Rīgā” (būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2021-313 (BV-21-1211-abv)).
- III. Darba uzdevums:** Veikt būvprojekta realizācijas būvdarbu būvuzraudzību un Pasūtītāja interešu nodrošināšanu minēto būvdarbu izpildē:

1. Vispārīgas prasības


- 1.1 iepazīties ar būvprojektu, Pasūtītāja un būvuzņēmēja līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu izpildi un būvuzrauga pienākumiem un tiesībām;
- 1.2 izskatīt un ne vēlāk kā triju darba dienu laikā saskaņot Būvdarbu veicēja izstrādāto būvdarbu veikšanas projektu vai sniegt Būvdarbu veicējam motivētus iebildumus to saskaņot;
- 1.3 veikt Pasūtītāja un būvuzņēmēja līgumā noteiktos būvuzrauga pienākumus, sniedzot Uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami būvdarbu izpildei vai būvdarbu defektu novēršanai;
- 1.4 pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, būvdarbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
- 1.5 pieprasīt no Darbu veicēja detalizētu informāciju un dokumentāciju par atjaunošanas darbu veikšanas posmiem, secību, laika grafiku, pielietojamajiem būvizstrādājumiem, darbu izpildes tehnoloģijām, metodēm un tehnisko aprīkojumu;
- 1.6 Būvuzraugam jāveic visas Tehniskajā specifikācijā - darba uzdevumā norādītās nepieciešamās pārbaudes, kā arī jāierodas ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc Būvuzņēmēja un Pasūtītāja pieprasījuma.
- 1.7 atrasties objektā nozīmīgāko būvdarbu veikšanas laikā, ja nepieciešams, arī vakara un nakts stundās, kā arī brīvdienās;
- 1.8 ziņot Pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;
- 1.9 pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās, sasaukt būvsapulces, nodrošināt būvsapulci organizāciju un sagatavot to protokolus;
- 1.10 nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes, zemes nogrūvuma iespējamība vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
- 1.11 veikt citus Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” norādītos būvuzrauga pienākumus.
- 1.12 veikt Darbu kvalitātes kontroli, veicot regulāras apskates uz vietas būvobjektā, īpašu uzmanību pievērst CCTV inspekcijas, hidrauliskai pārbaudei, kā arī šķembu un grunts sablīvējuma pārbaužu veikšanai.

2. Darbu kvalitātes nodrošināšana

- 2.1 nepieļaut neapstiprinātu būvizstrādājumu izmantošanu un atkāpes no līgumā noteiktās Darbu veikšanas tehnoloģijas;
- 2.2 pārbaudīt Materiālu apstiprinājumu formās uzrādīto būvizstrādājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām un būvprojektam;

- 2.3 pārbaudīt vai būvobjektā atrodas vienīgi sertificēti materiāli un iekārtas, tādā daudzumā, cik ir nepieciešams būvdarbu izpildei;
- 2.4 dot norādījumus un rīkojumus Darbu veicējam saistībā ar to izpildes kvalitāti;
- 2.5 veicamo pārbaužu apraksts pa tranšejas slāņiem:

Grunts sablīvējuma pārbaudes veicama pa tranšejas slāņiem šādos veidos:

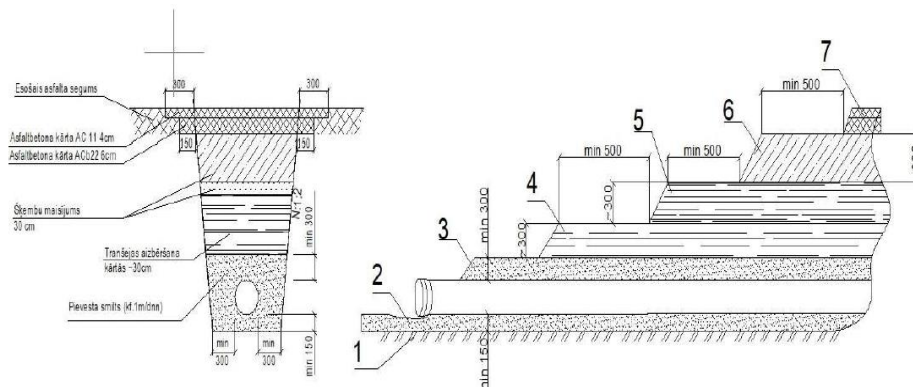

- 1) esošās grunts sablīvējuma pārbaudes atraktai tranšējai;
 - 2) pabēruma biezuma pārbaudes un smilts sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii penetrometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgļiem;
 - 3) apbēruma biezuma pārbaudes, kā arī pārbaudes vai cauruļvads ir noblīvēts gar malām;
 - 4) tranšijas aizbēdēšanas biezuma pārbaudes un grunts sablīvējuma pārbaudes; Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgļiem, katram aizbērtajam tranšijas slānim. Ja tranšijas dziļums starp cauruļvadu un salizturīgo slāni ir lielāks par 1,5 m, tad tiek veiktas arī grunts nestspējas pārbaudes ar brīvi krītošā svara deflektometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgļiem;
 - 5) salizturīgā slāņa biezuma pārbaudes un grunts sablīvējuma pārbaudes. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgļiem, katram aizbērtajam tranšijas slānim. Tiek veiktas arī grunts nestspējas pārbaudes ar brīvi krītošā svara deflektometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgļiem;
- 2.6 Cauruļvadu un aku izbūve, grunts blīvēšana pa slāņiem- pārbaužu veikšanas apraksts:
- 1) veikt trases nospraūšanas un to salīdzināšanu ar Būvprojektu pirms būvdarbu uzsākšanas;
 - 2) pieprasīt no Būvuzņēmēja repera iznešanas aktu;
 - 3) pārbaudīt un kontrolēt, vai darba zona iekārtota atbilstoši DOP un CSO shēmām;
 - 4) veikt esošās grunts sablīvējuma un nestspējas pārbaudes pie atraktas tranšijas sastādīt pārbaužu protokolu ;
 - 5) pārbaudīt un fiksēt, vai tiek lietoti aizsargvairogi, ja tranšijas dziļums pārsniedz 1,4m;
 - 6) kontrolēt un piefiksēt, vai tiek lietotas ūdens pazemināšanas iekārtas;
 - 7) kontrolēt, vai šķērsojamās komunikācijas tranšējā tiek aizsargātas un pareizi nostiprinātas;
 - 8) kontrolēt dzelzsbetona aku pareizu montāžu;
 - 9) pārbaudīt, vai cauruļvadu šķērsojumi caur aku sienām tiek aizdarīti ar hermētiskiem materiāliem;
 - 10) pārbaudīt aku vertikālītāti;

- 11) veikt kontrolrakumus, lai pārliecinātos par smilts pabēruma slāņa biezuma atbilstību Būvprojektam;
- 12) pārbaudīt piegādāto materiālu atbilstību saskaņotajiem materiāliem un to atbilstību Būvprojektam;
- 13) pārbaudīt cauruļvadu izbūves atbilstību ražotāja montāžas instrukcijai;
- 14) kontrolēt, vai tiek izveidots atbilstošā biezuma apbēruma un vai tiek sablīvētas cauruļu sānu malas;
- 15) veikt sablīvējuma pārbaudes aizbērtai tranšejai pa slāņiem, sākot ar cauruļvada apbērumu +30cm. Sagatavot pārbaudes protokolu;
- 16) veikt salīdzināmā slāņa biezuma pārbaudi un atbilstību Būvprojektam, kā arī veikt sablīvējuma pārbaudi ar Beldornii penetrometru;
- 17) veikt salīdzināmā slāņa nestspējas pārbaudi ar Brīvi krītošā svara deflektometru-sagatavojot pārbaudes protokolu ar rezultātu izdrukām, vai piedalīties Statiskās plātnes pārbaudē un fiksēt rezultātus;
- 18) veikt šķembu slāņa biezuma pārbaudi un atbilstību Būvprojekta prasībām;
- 19) veikt šķembu slāņa pārbaudi ar Brīvi krītošā svara deflektometru (Pielikums Nr.3)- sagatavojot pārbaudes protokolu, vai piedalīties Statiskās plātnes pārbaudē un fiksēt rezultātus;
- 20) piedalīties CCTV inspekcijas pārbaudē pirms ceļa klātnes izbūves un pēc ceļu klātnes izbūves;
- 21) veikt hidrostatisko pārbaudi izbūvētajiem cauruļvadiem un kanalizācijas akām;
- 22) veikt ceļu atjaunošanas/izbūves būvdarbu kontroli atbilstoši Būvprojektam un Autoceļu specifikācijai 2019.
- 23) veikt aku un tekņu pārbaudi atbilstoši Būvprojekta un DVP norādītajām prasībām.
- 24) katra posma darbi tiek fiksēti foto fiksācijā;
- 25) pasūtītajam tiek sagatavota un iesniegta atskaite un apliecinājums par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā;
- 2.7 nepieciešamības gadījumā, pieprasīt no Darbu veicēja detalizētu informāciju un dokumentāciju saistībā ar Darbu izpildes kvalitāti;
- 2.8 ja tiek konstatēti trūkumi Darbu izpildē, pārtraukt tos uz laiku, kamēr trūkumi tiek novērsti.

3. Darba un vides aizsardzība, atbilstība ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem

- 3.1 pārbaudīt Darbu atbilstību būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību, ceļu satiksmi un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
- 3.2 veikt būvdarbu drošības, kvalitātes un iekšējās organizācijas uzraudzību un kontroli;
- 3.3 pirms Darbu sākšanas pārbaudīt, vai ir izpildīti visi uzsākšanai izvirzītie nosacījumi;
- 3.4 pārbaudīt Darbu atbilstību pašvaldības institūciju izdotajām atļaujām un rīkojumiem.

4. Atbilstība darba uzdevumam, darbu izpildes apjomi

- 4.1 nodrošināt Darbu līguma nosacījumu, tai skaitā, tehniskās specifikācijas, skici un tāmju izpildi;
- 4.2 veikt izpildīto Darbu apjomu pārbaudi, fiksēt atšķirības no līguma tāmē noteiktajiem darbu apjomiem;
- 4.3 fiksēt iespējamo papilddarbu un izslēgto darbu apjomus un ar tiem saistīto laika ieguldījumu vai ietaupījumu, pārbaudīt un apstiprināt papilddarbu un izslēgto darbu tāmes;
- 4.4 pēc atsevišķu Darbu posmu pabeigšanas, samontētajiem mezgļiem, veikt fotofiksāciju;
- 4.5 piedalīties būvdarbu pieņemšanā, sevišķu uzmanību pievēršot segtajiem darbiem un pieņemt tikai tos būvdarbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai specifikācijai un būvprojektam;
- 4.6 veikt Darbu izpildes laika grafika un līguma izpildes termiņa kontroli.

5. Dokumentācijas pārbaude

- 5.1 trīs darba dienu laikā pēc saņemšanas pārbaudīt un komentēt/saskaņot būvdarbu veicēja iesniegto Darbu veikšanas projektu (saskaņā ar LBN 310-14);
- 5.2 ikmēneša izpildīto darbu izpildshēmas salīdzināšana ar būvprojektu un salīdzinājuma iesniegšana Pasūtītājam;
- 5.3 pārbaudīt vai būvdarbu veicēja rīcībā ir Būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
- 5.4 pirms sanāksmēm pārbaudīt un apstiprināt Darbu veicēja regulāras atskaites par Darbu progresu;
- 5.5 pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus, būvdarbu veicēja sagatavotos un iesniegtos dokumentus (atskaites, pārbaužu rezultātus, būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību un atbilstības deklarācijas, tehniskās pases, ražotāju garantijas, aktus par fakta konstatāciju, segto darbu un atbildīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, aktus par izpildītājiem darbiem - formas 2 un 3, papilddarbu un izslēgto darbu tāmes, darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, izpilddokumentāciju, u.c.).

IV. Uzdevuma izpildes noteikumi

1. Izpildot III.sadaļā minētos uzdevumus, Uzņēmējam jānodrošina sekojošs Pārstāvju laika ieguldījums:

Nr. p.k.	Pārstāvis	Cilvēkstundu ieguldījums
1.	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraugs	60

2. Uzņēmējam 1.punktā noteiktajā stundu apjomā jānodrošina Pārstāvja fiziskā atrašanās būvobjektā.
3. Pārstāvja būvobjektā pavadītā laika uzskaitē tiek veikta, ņemot vērā ierakstus Būvdarbu žurnālā. Pārstāvim ir pienākums katru reizi ierodoties būvobjektā Būvdarbu žurnālā veikt ierakstu par būvobjektā pavadīto laiku, norādot ierašanās un būvobjekta atstāšanas laikus, kā arī izpildītos uzdevumus.
4. Ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc būvdarbu veikšanas projekta saskaņošanas Uzņēmējs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam būvuzraudzības plānu. Papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, būvuzraudzības plānā jānorāda arī Pārstāvja būvobjektā pavadāmo cilvēkstundu skaita sadalījumu pa galvenajiem būvdarbu posmiem tā, lai nodrošinātu Uzdevuma izpildi līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, ņemot vērā, ka Pārstāvjiem jāpiedalās segto darbu, nozīmīgu konstrukciju pieņemšanā, būtisku būvdarbu pārbaudēs un būvobjekta pieņemšanā ekspluatācijā.

UZDEVUMA IZPILDES PIENĒMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

Rīgā, 20__gada __._____

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr. **40103023035**, tās _____ personā, kura darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 20__gada _____ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/20__/_/__) pamata, turpmāk - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un _____, reģ. Nr. _____, tās _____ personā, kur_ darbojas uz _____ pamata, turpmāk - **Uzņēmējs**, no otras puses,

sastādīja šo aktu par to, ka Uzņēmējs saskaņā ar __.__.20__. līgumu Nr. _____ ir sniedzis būvuzraudzības pakalpojumus laika periodā no 20__gada _____ līdz 20__gada _____ un Pasūtītājs pieņem būvuzraudzības pakalpojumus šādā apjomā:

Nr. p.k.	Pārstāvis	Cilvēkstundu ieguldījums	Stundas likme EUR, bez PVN	KOPĀ
1.	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraugs			
			Kopā:	
			PVN 21%:	
			Summa kopā:	

Kopā par summu EUR _____ (_____ eiro un __ eiro centi) bez PVN. PVN 21% sastāda EUR _____, summa kopā EUR _____.

Saskaņā ar Līguma 4.4.1.punktu no starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur 10% izpildes nodrošinājuma summu EUR _____ (_____ eiro un __ eiro centi).

Summa apmaksai, kas tiks pārskaitīta Uzņēmējam ir EUR _____ (_____ eiro un __ eiro centi).

Būvuzraudzības pakalpojumi sniegti atbilstoši Darba uzdevumam un abpusēju pretenziju nav.

Pakalpojumus nodeva:
Uzņēmējs:

Pakalpojumus pieņēma
Pasūtītājs:

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums tirgus izpētei “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves Rīgā, Pureņu ielā 16, būvuzraudzība” (identifikācijas Nr. T.I.121)

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves Rīgā, Pureņu ielā 16, būvuzraudzība” (identifikācijas Nr. T.I.121; turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves Rīgā, Pureņu ielā 16, būvuzraudzību atbilstoši uzaicinājuma un tā pielikumā pievienotā līguma projekta noteikumiem (turpmāk – Pakalpojums).
2. Apliecinām, ka:
 - 2.1. Visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;
 - 2.2. Uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;
 - 2.3. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā Pakalpojuma izpildei;
 - 2.4. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
 - 2.5. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Pakalpojuma izpildei Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;
 - 2.6. Ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums par ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves Rīgā, Pureņu ielā 16, būvuzraudzību, atbildīgā būvuzrauga pienākumus veiks šajā piedāvājumā norādītais būvspeciālists;
 - 2.7. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgsim piedāvātā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu 2 (divu) darba dienu laikā pēc būvuzraudzības līguma noslēgšanas¹.
 - 2.8. Tirgus izpētei iesniegtajā profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma polisē norādītais būvuzraugu spēkā esošais profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums nodrošinās apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz minētajā objektā Pretendenta veikto būvuzraudzību².
3. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

Pielikumā:

1. Būvuzrauga pieejamības apliecinājums, pavisam uz <lapu skaits> lp.
2. Būvuzrauga spēkā esoša profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma polises kopija uz <lapu skaits> lp.²
3. Finanšu piedāvājums uz <lapu skaits> lp.

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Juridiskā un pasta adreses, tālrunu un faksa numuri, e-pasta adrese >

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

¹ Norāda gadījumā, ja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija nav iekļauta piedāvājumā.

² Norāda gadījumā, ja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija ir iekļauta piedāvājumā.

Finanšu piedāvājums
tirgus izpētei “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves Rīgā, Pureņu ielā 16,
būvuzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr. T.I.121)

Nr. p.k.	Uzņēmēja Pārstāvji	Vienības (Uzņēmēja Pārstāvja būvobjektā pavadītās cilvēkstundas) cena (EUR bez PVN)	Maksimālais vienību skaits	Kopā (EUR bez PVN)
1.	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdrošības sistēmas, būvuzraugs	<...>	60	<...>
Uzdevuma izpildes cena, EUR bez PVN				<...>
PVN 21%, EUR				<...>
Uzdevuma izpildes cena, EUR ar PVN				<...>

Apliecinām, ka Uzņēmuma pārstāvju būvobjektā pavadītās cilvēkstundas likmē ir iekļautas visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, t.sk.:

1. ar Uzdevuma izpildi saistītie izdevumi ārpus Būvobjekta;
2. nodokļi (izņemot PVN);
3. samaksa par pakalpojuma sniegšanā iesaistītiem Uzņēmēja speciālistiem;
4. visi ar Uzdevuma izpildi saistītie administratīvie izdevumi, tostarp, bet neaprobežojoties, transporta, sakaru izdevumi, telpu noma, atļaujas, civiltiesiskā un medicīniskā apdrošināšana, darba drošības izdevumi un citi darba izdevumi;
5. Uzņēmēja peļņa, citu iestāžu, institūciju un speciālistu sniegtie pakalpojumi;
6. visas citas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas.

Apliecinām, ka piedāvājumā iekļautas visas norādītās nepieciešamās Uzdevuma izpildes izmaksas atbilstoši Darba uzdevuma prasībām.

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Vieta, Datums>

Būvuzrauga pieejamības apliecinājuma veidne

Ja ar <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, tirgus izpētes **“Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves Rīgā, Pureņu ielā 16, būvuzraudzība”** (identifikācijas Nr.T.I.121; turpmāk – Tirgus izpēte) rezultātā tiks noslēgts līgums par ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves Rīgā, Pureņu ielā 16, būvuzraudzību, apņemos veikt būvuzrauga pienākumus saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājuma pielikumā pievienoto darba uzdevumu un SIA “INSPIRITUS” izstrādāto būvprojektu “ŪKT ārējo tīklu izbūve piebraucamā ceļā Pureņu ielā 16, Rīgā” normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

<Būvuzrauga vārds, uzvārds >

<Būvuzrauga sertifikāta numurs>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Būvdarbu apjomi

SIA "INSPIRITUS" izstrādātais būvprojekts "ŪKT ārējo tīklu izbūve piebraucamā ceļā Pureņu ielā 16, Rīgā" paredz šādu būvdarbu izpildi:

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
	Ūdensapgāde Ū1		
2	Ūdensvada trases nospraušana - ārējie tīkli	m	132,5
3	PE ūdensvada caurule ar integrētu indikācijas kabeli PE100-RC/PP OD110mm, PN10, tās montāža tranšējā ~2,00m dziļumā (cauruļvadā ir jāatbilst SIA "Rīgas ūdens" tehniskām prasībām - saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" Tehniskajiem noteikumiem Nr. 2020-7.9-1294 no 30.06.2020, saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	m	132,5
4	EM dubultuzmava PE caurulei OD110, PN16	gb.	13
5	PE līkums OD110 13°, PN16	gb.	2
6	EM gala noslēgs OD110, PN16	gb.	2
7	Atloku krustgabals DN100/100 mm	gb.	1
8	Uz stiepi noturīgs uzliekams atloku adapteris PE caurulēm DN100/OD110, PN10	gb.	5
9	Indikācijas kabeļa izvadu montāža	kompl.	1
10	Betonēts balsts, iestrāde	gab	5
11	Atloku apakšzemes aizbīdnis Dn100, komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un ielas kapi	kompl.	3
12	Aizbīdņu plāksnīte ar atsevišķo balstu un pamatni	kompl.	3
13	Elektrometināma līkuma Ø110/13°, montāža (saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	gab.	2
14	Virszemes hidrants, C veida, divu ugunsdzēsības šļūteņu pievienošanas vietai ar "BOGDANOVA" tipa uzmavveida savienotājgalviņām ar nosacīto diametru DN80 atbilstoši LVS 187, DN100, PN16 (saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	kompl.	1
15	Hidranta plāksnīte ar atsevišķo balstu un pamatni	kompl.	1
16	Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, cauruļvadu komunikācijām (t.sk. esošajām aizsargčaulām) (saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	vietas	5
17	Tranšeju un būvbedru rakšana un ar to saistītie darbi (dziļumam no 0,20m zem cauruļvada līdz esošai virsmai) * (saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	m ³	183,0
18	Smilts (drenējoša - $K_f > 1 \text{ m/dnn}$) pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem (pie ~1,00m* platas tranšejas, un ūdensvada iebūves dziļuma ~1,90m), ietverot noblīvēšanu pa kārtām * (saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	m ³	53,0
19	Salturīga drenējoša grunts (pie ~1,35m* platas tranšejas, un ūdensvada iebūves dziļuma ~1,90m), blīvēta līdz $Dr > 95\%$ (dziļumam no cauruļvada apbēruma virsmas līdz atjaunojamā seguma konstrukcijas apakšējās kārtas apakšai) *, ** (saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	m ³	128,8

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
20	Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā, nepieciešamības gadījumā (saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	m	133
21	Vairogu montāža tranšeju sienu nostiprināšanai (saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	m	133
22	Izbūvētā ūdensvada pārbaude, presēšana 10 atm., hlorēšana u.c. darbi, saistīti ar jauna ūdensvada pārbaudēm un nodošanu (saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	m	132,5
23	Ūdensvada sistēmas dezinfekcija (saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	m	132,5
24	Izbūvētā ūdensvada izpilduzmērīšana un nodošana ekspluatācijā	kompl.	1
25	Brīdinājuma lentas montāža	m	132,5
Kanalizācija K1			
26	Kanalizācijas trases nospraušana - ārējie tīkli	m	116,7
27	PP monolītsienu kanalizācijas caurule OD250mm, SN8, tās montāža tranšējā ~2,75m dziļumā (cauruļvadā ir jāatbilst SIA "Rīgas ūdens" tehniskām prasībām - saskaņā ar SIA "Rīgas Ūdens" Tehniskajiem noteikumiem Nr. 2020-7.9-1294 no 30.06.2020, saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	m	38,2
28	PP monolītsienu kanalizācijas caurule OD250mm, SN8, tās montāža tranšējā ~2,30m dziļumā (cauruļvadā ir jāatbilst SIA "Rīgas ūdens" tehniskām prasībām - saskaņā ar SIA "Rīgas Ūdens" Tehniskajiem noteikumiem Nr. 2020-7.9-1294 no 30.06.2020, saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	m	72,0
29	PP monolītsienu kanalizācijas caurule OD200mm, SN8, tās montāža tranšējā ~2.00m dziļumā (cauruļvadā ir jāatbilst SIA "Rīgas ūdens" tehniskām prasībām - saskaņā ar SIA "Rīgas Ūdens" Tehniskajiem noteikumiem Nr. 2020-7.9-1294 no 30.06.2020, saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	m	6,5
30	Dz/b kanalizācijas aka, diametrā 1500, H~2.6-2.8m, komplektā ar akas pamatni u.c., ECOTOP (vai ekvivalents) stacionāra tipa kaļamā ķeta aku lūkas pārsedze ar enģi ar iestrādātu SIA "Rīgas ūdens" logo, blīvumiju, montāža - saskaņā ar SIA "Rīgas Ūdens" Tehniskajiem noteikumiem Nr. 2020-7.9-1294 no 30.06.2020, saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	kompl	2
31	Plastmasas kanalizācijas aka, diametrā 1000, H~2.0-2.3m, komplektā ar akas pamatni u.c., ECOTOP (vai ekvivalents) stacionāra tipa kaļamā ķeta aku lūkas pārsedze ar enģi ar iestrādātu SIA "Rīgas ūdens" logo, blīvumiju, montāža - saskaņā ar SIA "Rīgas Ūdens" Tehniskajiem noteikumiem Nr. 2020-7.9-1294 no 30.06.2020, saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	kompl	2

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
32	Plastmasas kanalizācijas aka, diametrā 560/500, H~1,98m, komplektā ar akas pamatni u.c., ECOTOP (vai ekvivalents) stacionāra tipa kaļamā ķeta aku lūkas pārsedze ar eņģi ar iestrādātu SIA "Rīgas ūdens" logo, blīvumiju, montāža - saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" Tehniskajiem noteikumiem Nr. 2020-7.9-1294 no 30.06.2020, saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	kompl	1
33	Pievienošanās esošajam ielas kanalizācijas tīklam aka K1-1924, (saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām),	kompl	1
34	Aizsargčaula iebetonēšanai esošajā dzelzbetona akā PP kanalizācijas caurulei OD250, montāža (saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	gab	1
35	Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, cauruļvadu komunikācijām (t.sk. esošajām aizsargčaulām), (saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	vietas	2
36	Tranšeju un būvbedru rakšana un ar to saistītie darbi (dziļumam no 0,20m zem cauruļvada līdz esošai virsmai) * (saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	m ³	275,7
37	Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem (pie ~1,00m* platas tranšejas), ietverot noblīvēšanu pa kārtām * (saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	m ³	46,7
38	Salturīga drenējoša grunts bruģakmens seguma zonā (pie ~0,35m* platas tranšejas bruģakmens seguma zonā, un kanalizācijas vada iebūves dziļuma ~1,63m), bļietēta līdz Dr>95% (dziļumam no cauruļvada apbēruma virsmas līdz atjaunojamā seguma konstrukcijas apakšējās kārtas apakšai) *, **	m ³	33,1
39	Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā, nepieciešamības gadījumā (saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	m	117
40	Vairogu montāža tranšeju sienu nostiprināšanai (saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	m	117
41	Cauruļvadu CCTV inspekcijas veikšana (caurulei OD200), hermētiskuma pārbaude (caurulei OD200, OD160, OD110), (saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	m	116,7
42	Kanalizācijas tīklu skalošana (saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā publicētām tehniskajām specifikācijām)	m	116,7
43	Izbūvētās kanalizācijas izpilduzmērīšana un nodošana ekspluatācijā	kompl.	1
44	Brīdinājuma lentas ieklāšana	m	116,7

Konfidencialitātes apliecinājums
tirgus izpētes “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves Rīgā, Pureņu ielā 16,
būvuzraudzība” (identifikācijas Nr. T.I.121) ietvaros

Piegādātājs <piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Piegādātājs), kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats>, personas kods <personas kods>, apliecina, ka, saņemot uz Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas saitē SIA “INSPIRITUS” izstrādātajam būvprojektam “ŪKT ārējo tīklu izbūve piebraucamā ceļā Pureņu ielā 16, Rīgā” (turpmāk – Būvprojekts), apņemas:

- 1) neizpaust trešajām personām Būvprojektā ietverto informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš minētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības;
- 2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” iespējamus ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus.

<Vārds, uzvārds, paraksts>

<Datums>
